

Culiacán, Sinaloa, 19 de octubre del 2019.

LIC. LIC. JUAN FRANCISCO VEGA MEZA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
GOBIERNO DEL ESTADO.
P R E S E N T E-

En atención a su solicitud, me permito hacerle llegar los avances físicos y financieros de los acontecimientos siguientes, mismos que me permito anexar.

-LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL 19 Y 2º DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DEPRESION TROPICAL 19-E).

-INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDO LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2018 (HURACAN WILLA).

Me permito informarle que los APIS correspondiente a ambos episodios, fueron aplicados al 100% de conformidad a los proyectos aprobados.

Se anexa los informes de La Etapa de Reconstrucción de ambas zonas con el avance siguiente:

TORMENTA 19-E: Con avance de obra al 100% y Avance Financiero de 70%
HURACAN WILA: Con avance de obra al 95% y Avance Financiero al 30%


Está en proceso de radicación el resto de los recursos ante la instancia correspondiente.

Agradeciendo su atención al presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



PAPIK RAMÍREZ BERNAL
Director General

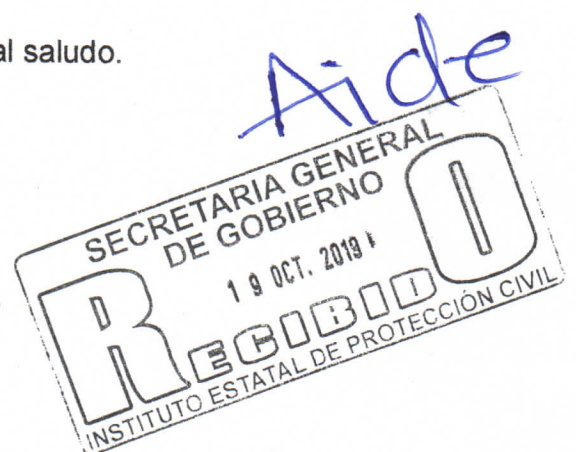



INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
SINALOA

HURACAN WILLA
AVANCE DE OBRA Y FINANCIERO
RECONSTRUCCION

ID	EJECUTOR	SECTOR	COMPETENCIA	MUNICIPIO	OBRA	TIPO DE OBRA	CARGO	MONTO	AVANCE DE OBRA %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
388	ISIC	CULTURA ESTATAL	ESTATAL	ROSARIO	RETIRO DE TEJA OBSOLETA FABRICACION DE CHARLANES Y DIAMANTES PARA ENCAUZAR EL AGUA PLUVIAL E IMPERMEABILIZAR TODA LA AZOTEA, COLOCACION DE TEJA, COLOCAR VIGA DE MADERA PARA SOPORTAR VIGAS POR COLAPSAR	RECONSTRUCCION	ESTADO	\$ 448,719.00			EN ESPERA DE RECURSOS
389	ISIC	CULTURA ESTATAL	ESTATAL	ROSARIO	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE OBSOLETO, FABRICAR CHARLANES Y DIAMANTES PARA ENCAUZAR EL AGUA PLUVIAL E IMPERMEABILIZAR Y APLICAR PINTURA EN GENERAL	RECONSTRUCCION	ESTADO	\$ 307,998.00			EN ESPERA DE RECURSOS
390	ISIC	CULTURA ESTATAL	ESTATAL	ESCUINAPA	RETIRAR IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, IMPERMEABILIZAR AZOTEAS, PINTAR MUROS Y PLAFONES EN GENERAL, SUMINISTRAR Y COLOCAR PLAFONES RETICULARES, SUMINISTRAR Y COLOCAR LAMPARAS EN PLAFON RETICULAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR PISO DE MADERA EN ESCENARIO, REPARAR Y REHABILITAR DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS	RECONSTRUCCION	ESTADO	\$ 1,745,037.00			EN ESPERA DE RECURSOS
391	ISIC	CULTURA ESTATAL	FEDERAL	ROSARIO	RETIRAR IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE YA OBSOLETO, FABRICACION DE CHARLANES Y DIAMANTES PARA ENCAUZAR EL AGUA PLUVIAL, IMPERMEABILIZAR AZOTEAS Y MUROS CON HUMEDAD, SUMINISTRAR Y COLOCAR PISO DUELA EN SALON DE DANZA Y APLICAR PINTURA EN MUROS Y PLAFONES EN GENERAL	RECONSTRUCCION	FONDEN	\$ 886,533.00	95%	30%	
Total								\$ 3,383,287.00			



INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
SINALOA

TORMENTA 19-E
AVANCE DE OBRA Y FINANCIERO

ID	EFECTOR	SECTOR	APORTACION	MUNICIPIO	OBRA	TIPO DE OBRA	MONTO	CARGO	AVANCE DE OBRA %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
983 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	CHOIX	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR ZONAS DAÑADAS.	RECONSTRUCCION	\$ 361,818.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
984 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	AHOME	IMPERMEABILIZANTE, PINTURA Y FUMIGACION	RECONSTRUCCION	\$ 306,887.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
985 ISIC	CULTURAL	FEDERAL	FEDERAL	AHOME	REEMPLAZAR IMPERMEABILIZANTE, REEMPLAZAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INUNDADOS CON AGUAS NEGRAS Y CIRCUTADOS, TALA DE ARBOLES QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE ESCUELA Y OCUPANTES, REEMPLAZO DE PUERTAS, RE-CABLEADO DE CONCHA ACUSTICA, PINTURA GENERAL EN PLANTA BAJA, REEMPLAZAR RED DE DRENAJE, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS.	RECONSTRUCCION	\$ 1,399,130.00	FONDEN	100%	70%	
986 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	AHOME	REEMPLAZAR MUEBLES DAÑADOS Y CONTAMINADOS POR AGUAS NEGRAS.	RECONSTRUCCION	\$ 573,897.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
987 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	GUASAVE	IMPERMEABILIZACION DE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DAÑADOS POR CORRIENTE DE AGUAS.	RECONSTRUCCION	\$ 307,513.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
988 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	CULIACAN	SELLADO DE CALEFATEO, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, TABLAROCA, DESMONTE DE GOTERO, APLANADO, DEMOLICION DE APLANADO.	RECONSTRUCCION	\$ 4,503,966.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
989 ISIC	CULTURAL	FEDERAL	FEDERAL	CULIACAN	RETIRO DE DOCRETO PARA RENOVAR Y RESTAURAR SELLO, IMPERMEABILIZAR, COLOCAR PIEDRA DE MAMPOSTERIA, REENTORTAR, RAPARACION DE ESPACIOS AFECTADOS EN TABLAROCA, YESO PINTURA.	RECONSTRUCCION	\$ 1,693,072.00	FONDEN	100%	70%	
990 ISIC	CULTURAL	FEDERAL	FEDERAL	CULIACAN	IMPERMEABILIZAR RECINTO, TALA DE ARBOLES Y DESTRONQUE, YA QUE ESTOS PONEN EN RIESGO MUROS, VENTANAS DE CAMERINOS, RAICE AFECTANDO SEVERAMENTE COLECTORES, REGISTROS Y RED DE DRENAJE DE TEATRO. COLOCACION DE VENTANAS DAÑADAS, APLANADOS EN YESO DE CAMERINOS, BAÑOS Y AREAS AFECTADAS, PISO REPARACION DE PISO FIRME DAÑADO, Y PIEDRA DE MAMPOSTERIA.	RECONSTRUCCION	\$ 667,783.00	FONDEN	100%	70%	
991 ISIC	CULTURAL	FEDERAL	FEDERAL	CULIACAN	REMOCION DE PISO DE LOBBY Y COLOCACION DE PISO DE DUELA NUEVO. RETIRO Y SUSTITUCION DE PISO DE FORO, PINTADOS Y ACABADOS DEL MISMO. APLANADO Y SELLADO DE MURO DE ALIJE DEBAJO DE FORO, REHABILITACION DE CARGAMO, SUSTITUCION DE SISTEMA DE DRENAJE Y DESASOLVE DEL MISMO.	RECONSTRUCCION	\$ 416,205.00	FONDEN	100%	70%	
992 ISIC	CULTURAL	FEDERAL	FEDERAL	CULIACAN	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO, COLOCACION DE NUEVO IMPERMEABILIZANTE, TRABAJO DE TABLAROCA EN MULTIPLES SALONES, PINTURA Y ACABADOS.	RECONSTRUCCION	\$ 858,258.00	FONDEN	100%	70%	
993 ISIC	CULTURAL	FEDERAL	FEDERAL	AHOME	IMPERMEABILIZAR, REMOVER PINTURA DAÑADA EN EXTERIOR Y PINTAR, APLANADOS EN YESO, REPARACIONES EN TABLAROCA, REPOSICION DE PUERTAS DOBLES DE CRISTAL.	RECONSTRUCCION	\$ 904,571.00	FONDEN	100%	70%	
994 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	AHOME	REMOCION Y REMPLAZO DE TEJAS DAÑADAS, IMPERMEABILIZACION, REPARACIONES GENERALES DE MUROS Y TABLARCOS FALSO PLAFON, REMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DAÑADOS POR INUNDACION.	RECONSTRUCCION	\$ 461,412.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
995 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	AHOME	IMPERMEABILIZAR, PINTAR Y SELLAR DAÑOS EN MUROS, REPARACIONES DE TABLAROCA, DRENAJO, DESASOLVE DE ESPACIO, REPOSICION DE EQUIPAMIENTO.	RECONSTRUCCION	\$ 239,003.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
996 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	AHOME	IMPERMEABILIZAR, DRENAJO, DESASOLVE DE ESPACIOS INUNDADOS, PINTADO Y SELLADO DE ESPACIOS CONTAMINADOS Y DAÑADOS, REPARACIONES EN TABLAROCA.	RECONSTRUCCION	\$ 582,864.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
997 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	SINALOA	IMPERMEABILIZAR, REPARAR MUROS Y TECHOS, ENLARRES Y APLANADOS, PINTURA, SELLADO, RESTAURACION DE MURALES.	RECONSTRUCCION	\$ 474,700.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
998 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	MOCORITO	IMPERMEABILIZAR, PINTAR, SELLAR, SANITIZAR ESPACIOS CONTAMINADOS, REPARAR APLANADOS, REPARACION DE DOMO Y HOJAS DE POLICARBONATO.	RECONSTRUCCION	\$ 460,087.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
999 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	CULIACAN	IMPERMEABILIZAR, REPARACION DE BAJANTES, REPARACION DE MUROS DE TABLAROCA, PINTURA Y SELLADO.	RECONSTRUCCION	\$ 332,018.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
1000 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	CULIACAN	IMPERMEABILIZAR, REPARAR DAÑO EN LOZAS, MUROS, PINTADO Y SELLADO DE AREAS CONTAMINADAS, REPARACION DE TABLAROCA DAÑADAS. REPARACION DE MULTIPANELES.	RECONSTRUCCION	\$ 497,805.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
1001 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	CULIACAN	IMPERMEABILIZAR, REPARAR DUCTOS DE AIRES DAÑADOS, REPARACION DE AULAS Y OFICINAS DAÑADAS POR HUMEDAD.	RECONSTRUCCION	\$ 579,070.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
1002 ISIC	CULTURAL	ESTATAL	ESTATAL	CULIACAN	REMOCION DE MACETERA EN TECHO, SELLADO, E IMPERMEABILIZADO, RELLENO DE LA MISMA. REPARACION DE TECHO DE TABLAROCA, PINTURA Y DETALLADO.	RECONSTRUCCION	\$ 76,394.00	FONDEN			EN ESPERA DE RECURSO
1003 ISIC	CULTURAL	FEDERAL	FEDERAL	CULIACAN	IMPERMEABILIZAR, REMPLAZO DE EQUIPOS DE A/A, REPARACION DE OFICINAS DAÑADAS.	RECONSTRUCCION	\$ 934,752.00	FONDEN	100%	70%	
Total							\$ 16,631,227.00				
